

BBA-敏捷基础培训

Agile Master: Zhao Cai

Mail: Cai.Zhao@partner.bmw-brilliance.cn

目录

- 敏捷概念
- SCRUM 3355框架
- AWM 介绍
- Jira 报工
- ISSUE状态更改
- 看板、燃尽图进度跟踪

敏捷概念

什么是敏捷？

敏捷是一种思维方式

Agile is a mindset :

Agile is a mindset:

Defined by values Guided by principles

Manifested through many different practices


----- Ahmed Sidky, Co-author of Becoming Agile in an Imperfect World

敏捷是一种思维方式：

由价值观定义，由原则指导，通过许多不同的实践体现。

为什么需要敏捷？

从软件作坊到软件危机，再到软件工程，传统的软件工程理论使得软件系统和开发流程变得越来越复杂。

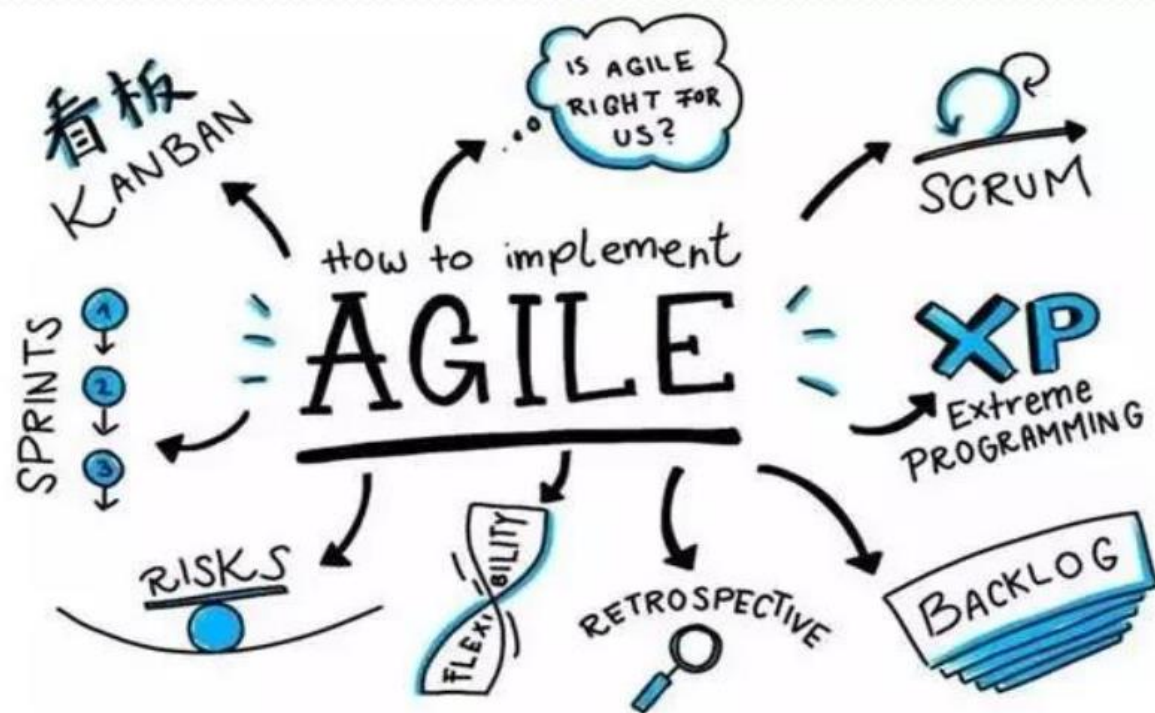

导致：

- 01 过长的开发周期
- 02 无法应对迅速变化的市场环境，需求很难修改
- 03 超预算开发
- 04 项目进度检查困难
- 05 最终交付的软件，不一定能满足用户需求
- 06 人员流动频繁，官僚制度严重

敏捷价值观和原则

我们一直在实践中探寻更好的软件开发方法，身体力行的同时也帮助他人。由此我们建立了如下价值观：

个体和互动

高于

流程和工具

可用的软件

高于

详尽的文档

客户合作

高于

合同谈判

响应变化

高于

遵循计划

也就是说，尽管右项有其价值，我们更重视左项的价值。

敏捷价值观和原则

Agile Principles

Principle 1

我们最重要的目标，是通过持续不断地尽早交付有价值的软件使客户满意。

Principle 2

欣然面对需求变更，即使在开发后期也一样。为了客户的竞争优势，敏捷过程掌控变化。

Principle 3

经常地交付可工作的软件，相隔几星期或一两个月，倾向于采取较短的周期。

Principle 4

业务人员和开发人员必须相互合作，一起工作，项目中的每一天都不例外。

敏捷价值观和原则

Agile Principles

Principle 5

激发个体的斗志，以他们为核心搭建项目。提供所需的环境和支援，辅以信任，从而达成目标。

Principle 6

不论团队内外，传递信息效果最好效率也最高的方式是面对面的交谈。

Principle 7

可工作的软件是进度的首要度量标准。

Principle 8

敏捷过程倡导可持续开发。责任人、开发人员和用户要能够共同维持其步调稳定延续。

敏捷价值观和原则

Agile Principles

Principle 9

坚持不懈地追求技术卓越和良好设计，敏捷能力由此增强。

Principle 10

以简洁为本，它是极力减少不必要工作量的艺术。

Principle 11

最好的架构，需求和设计出自自组织团队。

Principle 12

团队定期地反思如何能提高成效，并以此调整自身的举止表现。

SCRUM 3355 框架

SCRUM 3355框架

3种角色

- 1.PO:
Product Owner
- 2.SM:
Scrum Master
- 3.Team

3种工件

- 1.Product Backlog
- 2.Sprint Backlog
- 3.Product Increment

5种活动

- 1.Sprint
- 2.Sprint Planning Meeting
- 3.Daily Scrum Meeting
- 4.Sprint Review Meeting
- 5.Sprint Retrospective Meeting

5种价值观

- 1.Courage
- 2.Open
- 3.Focus
- 4.Commitment
- 5.Respect

SCRUM 3355框架

The Agile: Scrum Framework at a glance

Inputs from Executives,
Team, Stakeholders,
Customers, Users



Product Owner




The Team




**Product
Backlog**

Team selects
starting at top
as much as it
can commit
to deliver by
end of Sprint

**Sprint
Planning
Meeting**



**Sprint
Backlog**

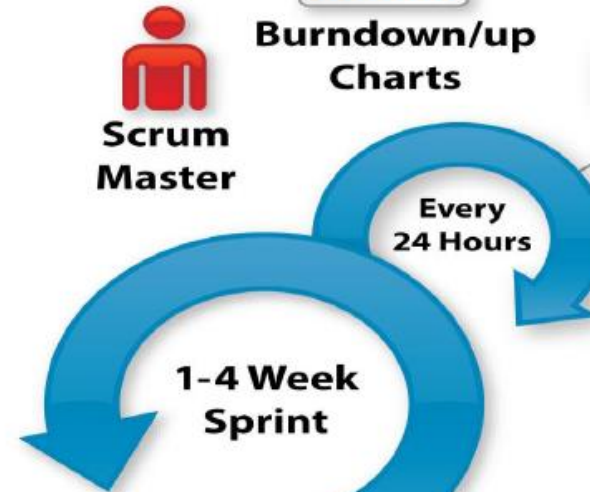

**Scrum
Master**



**Burndown/up
Charts**

Every
24 Hours



**Daily Scrum
Meeting**



Sprint Review



Finished Work



**Sprint
Retrospective**

**Sprint end date and
team deliverable
do not change**

SCRUM 三大支柱



透明度

看板可视化、5种仪式保持信息透明化和同步



检视

通过可视化看板、评审会、回顾会来对冲刺进行实时跟踪和检视



调整

通过每日站会、回顾会来对冲刺进行总结



经验主义和三大支柱不仅对Scrum过程很重要，它们也是它的**基础**。这是团队在创建的产品和团队使用的流程中实现**持续改进**的方式。

AWM 介绍

AWM 介绍

AWM Product Vision 产品愿景

支持敏捷转型和敏捷工作

日常敏捷工作的方向

产品敏捷工作的知识库

AWM is integrated in the Quality Management System of BMW Group

AWM被整合到宝马集团的质量管理体系中

AWM 是 BMW 集团 IT 的质量管理系统，用于产品中的敏捷工作（添加。通知：FG ISO 9001 乘数网络）

AWM 将被纳入宝马集团管理手册（2019 年第三季度）

AWM 不断得到进一步发展

AWM 支持 FG 对 BMW Group IT 的 ISO 9001 认证的贡献

DEVOPS基础设施

- [DevOps Workplace \(bmw-brilliance.cn\)](http://bmw-brilliance.cn)

AWM-ROLES

Mandatory roles:

- ! • Feature Team (FT)
- Agile Master (AM)
- Domain Owner (DO)
- Product Owner (PDO)
- Initiative Leader (IL)
- Line Manager (LM)
- Process Owner Ebene 0 (PO Ebene 0)

IT process roles

- IT Infomanager (IMG)
- IT Service Continuity Manager per Area (ITSCM-A)
- IT Service Desk (ITSD)
- Major Incident Manager (MIM)

Recommended roles:

✓ Currently there are no recommended roles in AWM
目前在 AWM 中没有推荐的角色

Role Mapping


➤ [Connect IT vs. AWM](#)
参考资料中可查看展开内容

COP

CoP (community of practice)


“实践社区是一群对他们所做的事情有着共同关注或热情的人，并在他们定期互动时学习如何做得更好。” - 艾蒂安温格

WHAT IS TRAINING COMMUNITY OR COMMUNITY OF PRACTICE (COP)?

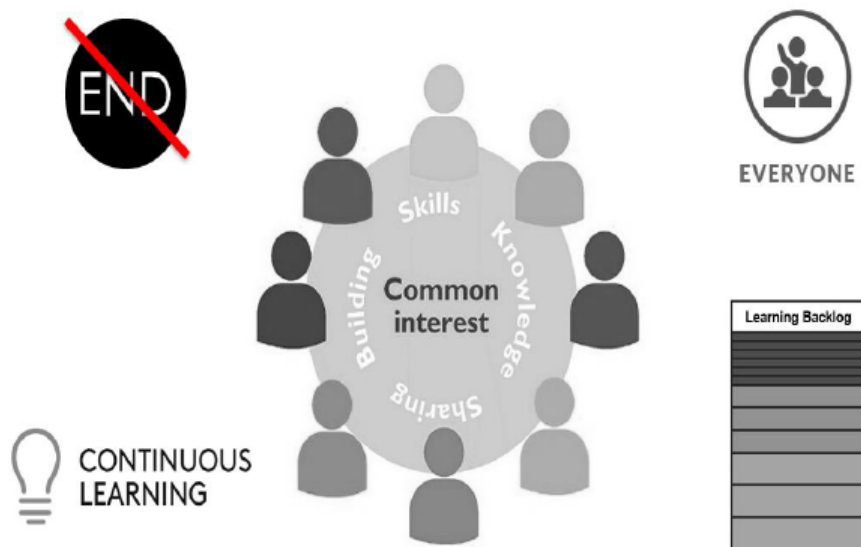

TRAINING COMMUNITY OR COP GOALS

- Encourage continuous learning by fostering an environment for us to learn from each other.
- Foster collaboration
- Co-design or co-create solutions to address tough challenges

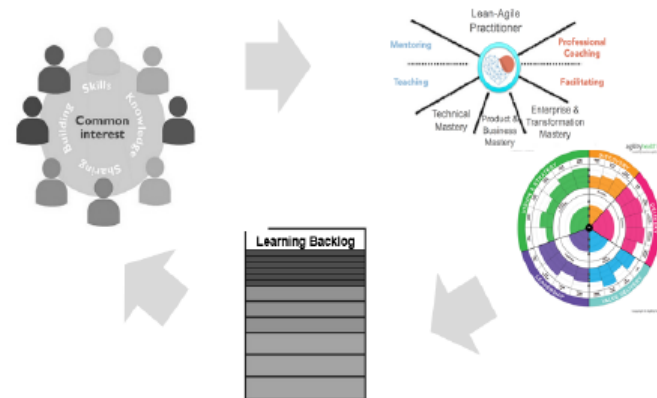

GLOSSARY词汇表

Agile Index 敏捷指数

Backlog
Item/Requirements

Backlogs

Definition of
Ready(DoR) - How
to estimate user
stories

Definition of
Ready(DoR) –
INVEST principle

Definition of
Ready(DoR) –
TREASURES principle

Impediments
Removal - Process

BACKLOG ITEM/REQUIREMENTS

OKR	客观关键结果是具有最高抽象层次的战略目标。例如。董事会决定、开始生产和重大举措。OKR 是“目标和关键结果”的缩写OKR 的一个可行定义：OKR 是一个批判性思维框架和一个持续的过程，旨在确保员工的密切协作、专注和交付可衡量的结果。OKR 不是一种绩效评估方法，尽管它们可以在有关评估的各自沟通中提供结构化帮助。OKR 可以适用于个人和团队。它们可以自下而上和自上而下创建，但这些想法通常应来自相应的个人或团队并相互同意。OKR 可用作结构化目标管理的系统，具有以下优点：激励员工，提高目标实现率，从而提高生产力，指定期望，提高个人或团队目标的透明度和同理心连接整个组织的不同目标。OKR 应该是聪明和雄心勃勃的。
SAGA	具有高抽象级别战略级别要求。Saga 由以下标准定义：业务和价值驱动，影响通常不止一种产品，时间有限，范围明确，完成定义 (DoD) *。Saga 通常可以在一个或多个领域周期中实施。Sagas 还可用于显示域目标和关键结果的当前操作。传奇由几个史诗组成。一旦需求被不止一个 Epic 描述，它就需要一个 Saga。
EPIC	比 Saga 描述更详细的需求。史诗由以下标准定义：业务价值和技术驱动，通常影响一个产品，时间有限，范围明确，完成定义 (DoD)*。史诗通常可以在一个或多个产品周期中实施。Epics 还可用于显示对产品目标和关键结果的当前操作。史诗由几个（用户）故事组成，不一定需要父传奇。

BACKLOG ITEM/REQUIREMENTS

- SMART原则:
 - S=Specific
 - M=Measurable
 - A=Attainable
 - R=Relevant
 - T=Time-bound
- 一个月內一个sprint完成故事点数提升10%

BACKLOG ITEM/REQUIREMENTS


USER STORY	描述要完成的工作的最详细的要求。故事由以下标准定义：独立、可协商、价值、估计、小型、可测试（=INVEST）*。（用户）故事必须在冲刺中实现。（用户）故事可以由几个子任务组成，不一定需要父史诗。
TASK	不必在（用户）故事格式中描述的具体技术任务。任务就像没有直接客户价值的待办事项。大多数功能团队成员创建任务。任务可以由多个子任务组成。
SUB-TASK	帮助组织您的日常工作。子任务的大小没有确切的限制。作为（非强制性）经验法则可以服务一个工作日 - 子任务应该由一个人在工作日完成。同样，每个（用户）故事或任务都没有义务拥有子任务——这个决定取决于开发团队，实际上取决于需求的大小。一个好的做法是使用子任务，以便能够一次与多个人或团队一起处理（用户）故事。使用子任务以避免开销的先决条件是丢弃所有其他单独的待办事项管理工具（即笔记、微软笔记、便利贴等）。
DEFECT	偏离要求。在快速和早期失败的意义上，缺陷被尽早检测到，从而要求特性团队修复缺陷。

待办事项的级别取决于需求的成熟度，并且可能会在工作过程中发生变化。

BACKLOG ITEM/REQUIREMENTS

- User Story
- 作为(用户角色/who)... 我想要（功能/what）... 以便可以（价值/why） ...
- As [ex. Cost manager/Analyst] I want [Collecting energy data & related data] so that [I can analysis further]
- AC（ Acceptance Criteria ）
- When(应用场景/前提条件)..... given(输入) ...then(期望结果)
- 1. When there's only one equipment, I input/give xxx[equipment No. in the system], then [the working time of the equipment should be displayed by details].
- 2. When there are 10000 equipments, I input/give [xxx product line No. in the system], then [the working time of all equipment should be displayed by list].

ALIGNMENT WORKING

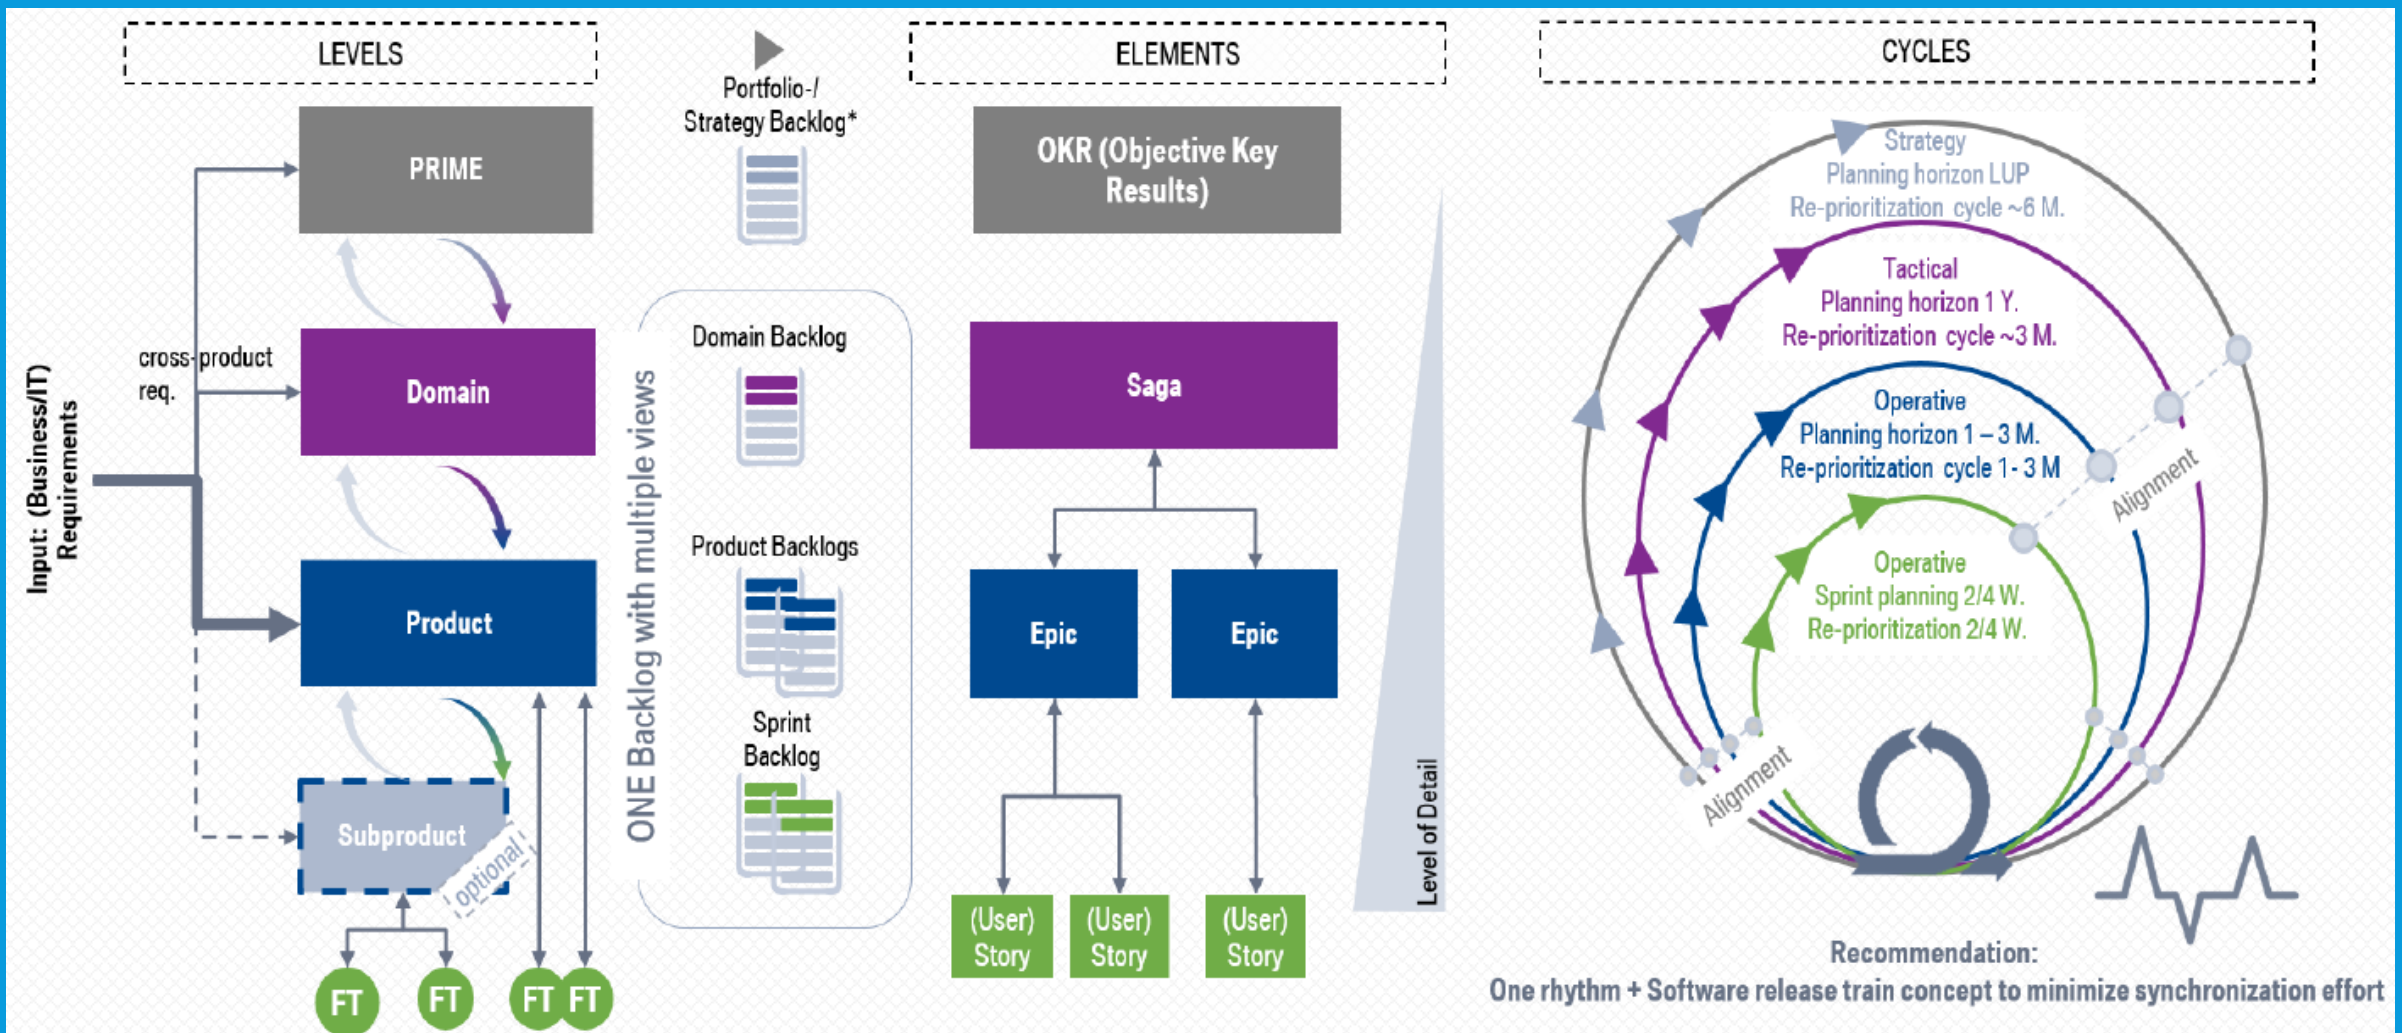

ALIGNMENT WORKING

Level	Team set-up	Backlog	Planning Cycles	ATC (JIRA)
PRIME	PROCESS OWNER + DOs	OKR	STRATEGIC CYCLE	-
Domain	DO + PDOs	SAGA	DOMAIN CYCLE	SAGA
Product	PDO + Feature Team representatives	EPIC	PRODUCT CYCLE	EPIC
Subproduct <i>optional</i>	SPDO + Feature Team representatives	USER STORY	SPRINT	STORY
	BIZDEVOPS	USER STORY (SUB-) TASKS	SPRINT	(SUB-) TASKS

BACKLOG



Domain Backlog

域积压是每个域的所有要求的总体摘要

Product Backlog

产品待办列表是产品中已知需要的所有内容的有序列表

它是对产品进行任何更改的唯一要求来源

产品负责人负责产品待办列表，包括其内容、可用性和订购

产品待办列表永远不会完整

Sprint Backlog

Sprint Backlog 是为 Sprint 选择的一组 Product Backlog 项目，以及交付产品增量和实现 Sprint 目标的计划

Sprint Backlog 是开发团队对下一个增量中将包含哪些功能以及将该功能交付到“完成”增量中所需的工作的预测

BACKLOG ITEM/REQUIREMENTS

- MVP (Minimum Viable Product –最小可行性产品)


包含业务需求、技术需求等

理想情况下，每一个待完成的工作都将对客户产生价值

PO对该列表进行优先级排序

每个迭代开始前，优先级排序还需再度修正

待办事项列表中的条目以用户故事的形式出现 (可选)

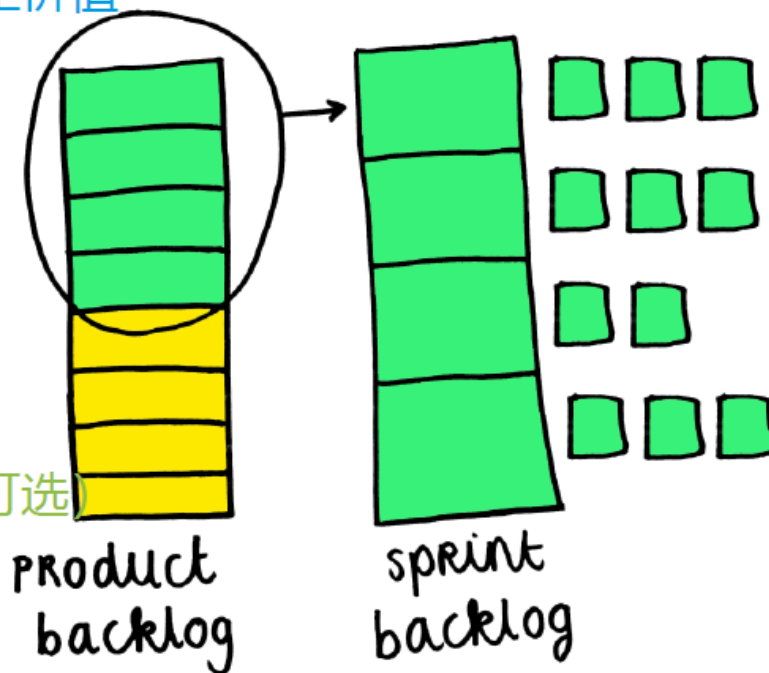

DOR-CHECKLIST OF BBA

- 01-04-01 Product specific DOR - BBF-43
Agile Master CoP - ATC Confluence (bmw-
brilliance.cn)

DOR-用户故事估算

- 敏捷估算扑克牌的正确玩法_网易视频(163.com)

DOR-用户故事INVEST原则

Letter	Meaning	Description
I	Independent 独立的	用户故事应该是自包含的，在某种程度上不依赖于另一个用户故事。
N	Negotiable 可协商的	用户故事不是明确的合同，应该留出讨论空间。 用户故事功能足够，描述足够详细
V	Valuable 有价值的	用户故事必须为利益相关者带来价值。 根据以下标准进行优先级排序： 重要性：业务价值
E	Estimable 可估计的	您必须始终能够估计用户故事的大小 使用斐波那契数列估计用户故事（故事点）
S	Small 小的	用户故事不应该大到无法以一定的准确度计划/任务/优先级。 用户故事可以在一个 sprint 中实现
T	Testable 可测试的	用户故事或其相关描述必须提供使测试开发成为可能的必要信息。 用户故事可以在 sprint 中进行测试

USER STORY EXECUTION

At the end of the Sprint Planning

Sprint Goal	To Do	Doing	Done
The goal of this sprint is To make the purchasing part of the website mature enough to be able to handle the whole process and users can experience a full purchasing process, through which other functionalities of the website will be more meaningful.	Item #1 t.1.6 t.1.3 t.1.2 t.1.4 t.1.1 t.1.5		
	Item #2 t.2.1 t.2.3 t.2.2		
	Item #3		
	Item #4		
	Item #5		



A few days later

Sprint Goal	To Do	Doing	Done
The goal of this sprint is To make the purchasing part of the website mature enough to be able to handle the whole process and users can experience a full purchasing process, through which other functionalities of the website will be more meaningful.			Item #1 t.1.6 t.1.1 t.1.2 t.1.4 t.1.5
	Item #2 t.2.7	t.2.6 t.2.5	t.2.1 t.2.3 t.2.2 t.2.4
	Item #3 t.3.4 t.3.5 t.3.3 t.3.2	t.3.1	
	Item #4 t.4.4 t.4.2 t.4.5		
	Item #5		

DOD

Definition of Done (DoD)

用户故事完成 DoD

- ☐ 用户故事优先级(价值驱动)得到了业务方的一致理解；
- ☐ 用户故事、原型、UI/UX 得到了业务方的确认；
- ☐ 用户故事、原型、UI/UX 得到了团队的一致理解；
- ☐ 用户故事完成了编码和自测，满足 User Story 验收准则，无故障遗留；
- ☐ 用户故事完成了单元测试；
- ☐ 每日代码走查 (Code Diff)；
- ☐ 每日构建版本无编译警告和错误，红不过夜；
- ☐ 用户故事所有测试用例 100%通过；

PO 负责

迭代完成 DoD

- ☐ 集成测试用例 100%通过
- ☐ 回归测试用例 100%通过
- ☐ 业务验收通过

发布完成 DoD

- ☐ 发布联调系统测试通过
- ☐ 安全、性能测试通过
- ☐ 所有确认要修复的故障都已关闭

DoD 是不断演进的

每个迭代/发布，打印一张 DoD，逐条验证每个检查点是否满足了。没有满足的，注释出来，进行分析和持续改进。

过程的每个环节每个人都要清楚 DoD!

- 故事澄清
- 原型提供
- 依赖明确
- 总体设计
- 已估算

需求就绪

- 开发、测试完成
- CI, Code Review 通过
- 给PO演示通过

需求完成

- ST回归和UAT验收通过
- 测试和验收报告产生

迭代完成

DoD在不同层面的范围

AWM-MEETINGS

Meetings 会议

标*的对于那些使用 Scrum（根据 Scrum 指南）作为他们的敏捷方法的人来说是强制性的。

Feature Team

! (Sprint) Planning

✓ Sprint Backlog Refinement

✓ Daily Stand-Up

✓ Sprint Review*

! (Sprint) Retrospective

Product

! Product Cycle Planning

✓ Product Backlog Refinement

✓ Product Stand-Up/Risk Roaming

✓ Product Cycle Review*

! Product Cycle Retrospective

Domain

! Domain Cycle Alignment

✓ Domain Backlog Refinement

✓ Domain Stand-Up/Risk Roaming

✓ Domain Cycle Review*

! Domain Cycle Retrospective

OKR Meetings

✓ Draft OKR Refinement & Planning

✓ OKR Confidence Check

✓ Final OKR Refinement

✓ OKR Review & Retro

REFINEMEETING

01

目的

- 1.提前为Sprint Planning meeting做铺垫，同时不定期的帮助团队理解产品的Vision；
- 2.帮助PO理解用户故事/需求的工作量的范围，补充验收标准，以及优先级的排序；

02


内容

- 1.用户故事/需求讨论，分解用户故事/需求
- 2.完善拆分后的用户故事/需求的验收标准
- 3.排定优先级，评估用户故事/需求的规模

03

说明

- 1.需要整个Scrum团队所有成员参加；
- 2.由PO主导，此活动的输出是对下个迭代内容的充分理解；
- 3.每个迭代开始前的持续活动，不一定是特定会议

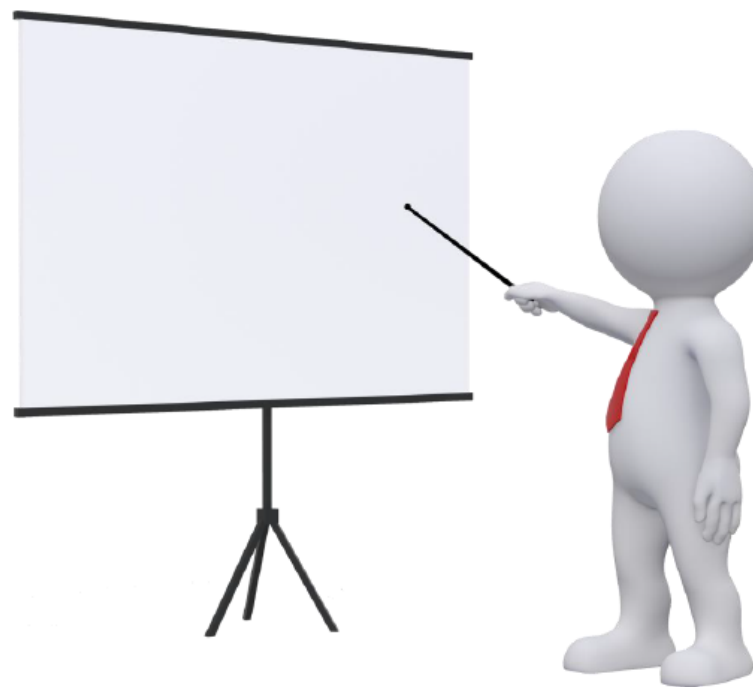

SPRINT PLAN MEETING

01]

目的

- 1.确定当前迭代目标，制定出团队可行的交付计划。

02]

内容

- 1.制定当前迭代开发的目标：从PBL中选取当前迭代要完成的工作项，选取上限以**团队速率和当期可投入产能**为准，选满为止
- 2.推荐选取一部分技术改进类故事或需求，持续对框架或环境进行重构和优化
- 3.团队每个成员从迭代计划中认领工作项，拆分任务（可选）估算工期

03]

说明

- 1.迭代计划会在每个迭代的第一天召开；
- 2.合理可行的迭代计划是团队迭代运作成功的关键；
- 3.需要整个Scrum团队所有成员参加，由全体成员共同对迭代目标作出承诺，是敏捷团队自组织的最好体现



DAILY MEETING

01

目的

- 1.团队间的信息同步，开发团队沟通工作进展，问题，并及时进行决策调整。

02

内容

- 1.由Scrum Master来主持并记录会上出现的阻碍事项
- 2.团队成员回答3个问题：为了达成冲刺目标，今天我做了什么，今天将要做什么，有没有阻碍和风险需要同步给团队
- 3.为了保证团队成员能够集中注意力，不采用轮流发言，由前一位发言人指定下一位，如果指错可做小小惩罚

03

说明

- 1.15 minutes，每天固定时间固定地点
- 2.站会准时开始准时结束，原则上禁止拖延
- 3.会议上每个人发言不超过2分钟，不展开细节，如果需要可会后约专题会讨论



REVIEW MEETING

01]

目的

- 1.团队检视迭代所交付的产品增量，给PO演示测试已验证通过的故事，收集反馈。
- 2.团队讨论进度风险并及时调整迭代计划和产品Backlog。

02]

内容

- 1.会前，Scrum Master邀请PO和相关干系人参会；开发团队准备好会议室及演示环境
- 2.会上，团队成员给PO和其它干系人演示已完成的迭代增量，收集反馈，并解答与会人员提出的问题
- 3.Scrum Master 简要总结迭代当前的工作完成情况，包括一些希望PO支持解决的问题或困难
- 4.对评审中发现的问题，改进意见，团队和PO一起商定恰当的处理方式，包括作为新需求添加到产品Backlog，或立即修复；对评审中发现的进度风险，制定出解决办法并商定责任人

03]

说明

- 1.让PO了解产品和团队的当前状况，及时给团队提出反馈（接受、部分接受或者拒绝），尽早发现问题，也让开发团队了解团队整体的交付进展、风险，及时调整计划和安排，保证迭代顺利交付。
- 2.SM或者BA需要记录好PO的反馈，根据情况建立新的卡片放到下一个Sprint的backlog里面一起排定优先级，由团队来完成



RETROSPECTIVE MEETING

不是问责会

01 目的

1.对迭代实施过程中的流程、环境、工具、技能、沟通协作等进行全面的回顾，识别做得好的和需要改进的事项，并行优先级排序，挑选出最重要的且能落实的事项进行改进。以此建立起团队持续改进、追求卓越的团队文化。

02 内容

- 1.会前：每个团队成员应思考一下自己所观察到的现象、问题，和自己的建议，如本次回顾会需要PO参与，则Scrum Master提前通知PO参会
- 2.会上：对冲刺目标进行复盘；对复盘结果进行梳理总结（哪些做的很好需要继续保持、哪些还可以做的更好）
- 3.从改进事项中挑出TOP3放入下次冲刺中作为冲刺改进进行跟踪和落实

03 说明

- 1.敏捷能力的提升涉及很多方方面面的提升，意识的转变，没有团队可以一步到位，因此一个例行的团队自我反思并制定出切实可行的改进措施的持续改进机制至关重要，否则只能停留在很低级无效的阶段，团队也会对敏捷没有信心；
- 2.回顾的形式很多种，经常变换形式可以让团队保持积极、愉快，提高参与度



个人概括

- 短，迭代要短，响应才快
- 小，故事粒度要小，需求才清晰，质量才高，调整才灵活
- 要，以目标为导向，要事优先，尽量少做，提高投资回报率
- 自，自组织，自我改进
- 流，架构简单，过程流畅，避免卡顿、消除浪费

看板、燃尽图进度跟踪

JIRA 报工

ISSUE状态更改

Q&A

打分

你为本次培训打几分——满分10分

THANKYOU!!!
