
领悦数字

兼容性测试过程管理细则

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人	批准人
1.0	2020/12	新建	Liu Chengju Li Shanshan	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong
1.1	2021/07	更新	Li Shanshan	Zhang Renlei Hou Junliang	Ji Xiaoyong

目 录

1. 导言.....	4
1.1 目的.....	4
1.2 范围.....	4
1.3 术语定义.....	4
2. 主要角色及职责.....	4
3. 入口准则.....	5
4. 输入.....	6
5. 过程描述.....	6
5.1 参加需求评审.....	7
5.2 制定测试计划与方案.....	8
5.3 设计测试用例.....	8
5.4 执行兼容性测试.....	8
5.5 测试总结.....	9
6. 出口准则.....	9
7. 输出.....	9

1. 导言

1.1 目的

规范并明确兼容性测试流程，实现组织内兼容性测试过程的统一，提升整体测试效率，并为兼容性测试活动提供指导。

1.2 范围

领悦数字开发或实施的所有项目的兼容性测试工作。

1.3 术语定义

兼容性测试：为验证软件应用在硬件或基础软件环境发生变化时能否继续正常运行的测试过程。

2. 主要角色及职责

角色	职责
产品经理（PO/BA）	● 澄清产品愿景和产品关键特征； ● 提供对应的需求文档/用户故事，明确兼容性测试指标，例如兼容性测试涉及到目标人群和品牌机型、ROM、芯片、屏幕分辨率、软件、版本、网络、地域等； ● 组织需求评审，进行兼容性测试需求分析； ● 配合兼容性测试用例的评审工作； ● 完成兼容性测试结果的确认；
敏捷教练（SM）	● 推动敏捷过程和方法论的实施，保护团队在 sprint 过程中不受干扰； ● 推动问题的解决； ● 协助推动过程交付质量的提升，如故事点、验收标准、DOR、DOD等；

测试管理岗（QM）	● 测试需求接口人，负责接收兼容性测试需求和需求变更； ● 确定测试策略； ● 参与需求评审，了解兼容性测试需求内容和测试指标； ● 依据项目计划，审核测试计划的合理性； ● 测试准入审核； ● 评审测试用例； ● 审核测试执行结果，判断是否符合准出标准； ● 协调跨系统测试联调事项； ● 跟踪测试过程，协助解决测试过程中的问题，监控测试过程中的风险； ● 跟踪和管理测试缺陷，审核测试报告；
测试实施岗（QC）	● 参加需求评审和需求讲解会议； ● 制定测试实施计划； ● 完成兼容性测试设计工作，设计测试用例，组织测试用例评审； ● 兼容性测试用例执行； ● 记录、提交并验证测试过程缺陷，配合开发进行问题复现； ● 抛出测试过程中发现的问题和风险； ● 汇总结果，形成测试报告；
开发（DEV）	● 参与需求评审和用例评审； ● 提供可测版本，测试过程技术支持； ● 及时修改测试过程中的缺陷； ● 完成生产数据分析并为产品经理提供兼容性相关指标信息；
运维人员（OPS）	● 搭建并维护系统测试、运行环境； ● 发布各环境版本。

3. 入口准则

- (1) 兼容性测试需求评审通过，Jira/Confluence 上可查阅评审通过的


需求文档/用户故事；

- (2) 兼容性测试指标明确；
- (3) 功能测试完成，并且测试通过率达到 90%。

4. 输入

- (1) 评审通过的需求文档/用户故事
- (2) 手机或浏览器清单
- (3) 待测版本（已通过业务功能测试）

5. 过程描述

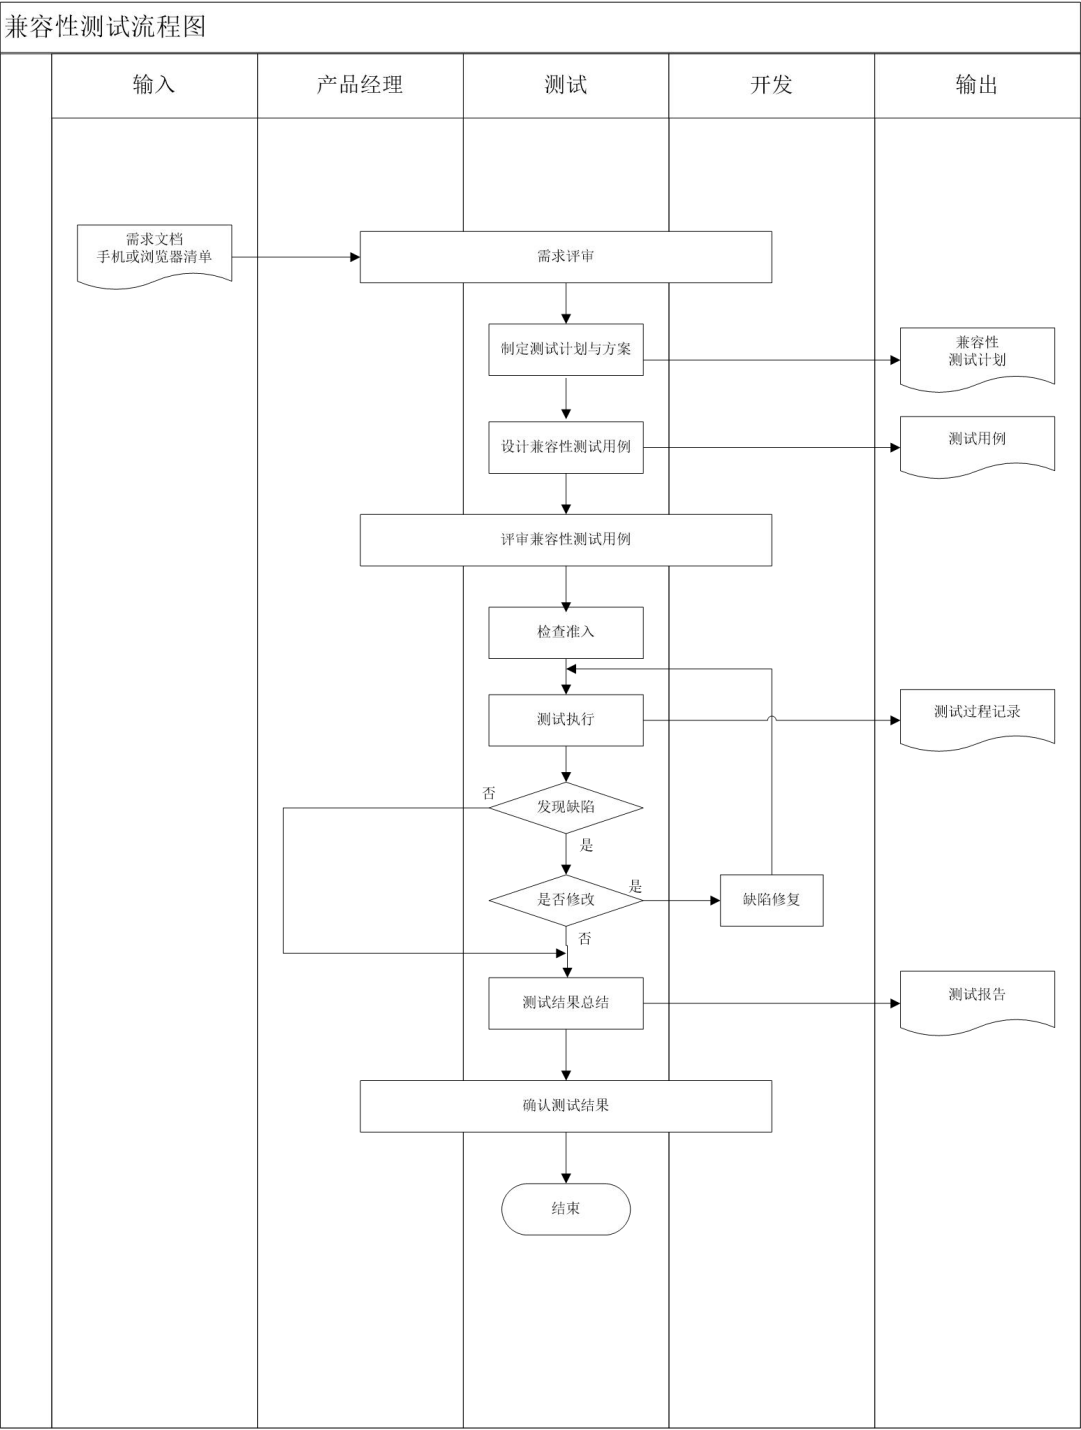

5.1 参加需求评审

测试管理岗与相关测试人员需参加产品经理组织的需求讲解或评审会，对需求文档（包括兼容性需求）提出评审和改进意见。

5.2 制定测试计划与方案

测试管理岗组织测试实施岗分析兼容性测试需求，制定兼容性测试方案。测试实施岗根据兼容性测试方案，与相关人员确立测试启动/终止条件、测试方法、测试手段和测试策略，以及缺陷处理机制和资源要求，制定具体的测试计划。

兼容性测试可从以下几个方面考虑：（1）设备兼容性测试，评估应用程序在各种移动设备/手持设备上的兼容性；（2）网络兼容性测试，评估应用程序在各种 4G/5G 网络或 Wi-Fi 上的兼容性；（3）Web 浏览器兼容性测试，验证应用程序对支持的互联网浏览器的可用性和可读性。

5.3 设计测试用例

测试实施岗根据兼容性测试计划与方案的要求，设计并编写兼容性测试用例，并记录在 Jira 中。

用例设计过程中，开发负责人安排相应开发人员提供技术上的配合与支持。用例编写完成后，测试实施岗组织产品经理、开发人员等进行兼容性测试用例评审。

5.4 执行兼容性测试

执行测试前，测试实施岗需验证发布的测试版本是否按照属于本 SPRINT 周期内发布计划/测试计划包含的预期功能；若与预期发布功能不一致，中止测试启动，并开发团队沟通相关问题。

测试实施岗按照测试用例执行测试覆盖，测试发现的缺陷记录在 Jira 中。测试过程中收集、汇总测试执行发现缺陷，形成缺陷清单，并记录测试过程；配合开发人员进行问题复现；跟踪缺陷状态，直至缺陷关闭。

若测试发布新版本，需要进行影响范围分析，以确定回归测试的范围。

测试实施人员每天发出测试日报邮件，附件《XX 项目测试日报》，日报中需描述出当前测试风险（附加 BUG-jira 链接，明确@相应开发并明确该开发

人员需要处理的 BUG 数量）；

测试管理岗每天跟进测试整体进度，了解测试版本的开发质量与测试质量，对 Jira 中提交的缺陷按照优先级、严重程度等进行分类分析以及趋势分析。若测试进度预判在可控范围外，及时发出风险预警邮件，并通知相关干系人（产品经理）沟通解决方案。

开发人员负责及时修复测试过程中发现的缺陷，更新 Jira 中缺陷状态；并及时提供回归测试版本，由运维人员发布在测试环境，方便测试人员对缺陷的修复情况进行验证。

测试执行过程中的问题，测试管理岗负责协调处理。

5.5 测试总结

测试完成后，测试实施岗在确保测试过程使用 Jira 的前提下自动生成测试报告，包括：测试范围、CASE 以及 CASE 执行结果等；另外，测试实施岗需要对遗留 BUG 进行分析，且把分析结果整合在报告中。

测试报告需经过产品经理与开发人员确认；若测试未达到准出标准，测试报告中需给出相关未达到准出标准的意见以及说明，由产品经理确定测试活动是否结束。

测试管理岗组织测试回顾会，对测试过程进行总结分析，包括成功经验以及需要吸取的教训等。

6. 出口准则

- (1) 所有兼容性测试用例与场景都已执行完毕；
- (2) 测试案例通过率达到 95%；
- (3) 没有遗留 Critical 和 High 级别的缺陷；
- (4) 兼容性测试结果汇总完成；
- (5) 测试报告通过产品经理确认。

7. 输出

- (1) 兼容性测试计划；
-

- (2) 兼容性测试用例；
- (3) 兼容性测试过程记录；
- (4) 兼容性测试报告。
