
领悦数字

项目变更管理指南

修订记录

[illegible]

目录

1	引言	4
1.1	目的	4
1.2	范围	4
2	入口准则	4
3	主要角色及职责	4
4	变更流程	6
4.1	流程说明	6
4.1.1	变更申请	6
4.1.2	评估变更	6
4.1.3	审批变更	7
4.1.4	执行变更	7
4.1.5	验证变更	7
5	出口准则	8

1 导言

1.1 目的

规范并明确领悦数字项目变更测试工作的内容和要求，定义领悦数字项目变更过程中相关岗位工作职责及流程，为项目变更测试相关工作提供实施指导。

1.2 范围

本文档面向领悦数字质量管理部门，适用于所有软件开发类项目的项目范围变更、项目需求变更、技术架构变更、配置项变更等。

2 入口准则

申请人已提交项目变更的信息和内容


3 主要角色及职责

角色名称	职责描述
产品经理（PO/BA）	- 需求评审的组织者，负责组织需求评审活动，召集相关干系人参加需求评审活动； - 作为评审人员，参加测试计划、测试用例、测试报告等评审；
敏捷教练（SM）	推动敏捷过程和方法论的实施，保护团队在sprint 过程中不受干扰；

角色名称	职责描述
	协助推动解决评审活动中遇到的问题；
测试管理岗（QM）	- 测试评审活动的组织者，规划测试活动中的各类评审活动； - 组织测试人员参加需求、设计等评审活动； - 组织测试计划、测试用例、测试报告等的评审活动； - 跟踪评审发现相关的缺陷，直至缺陷关闭；
测试实施岗（QC）	- 参加需求评审、设计评审等； - 编写测试计划、用例和报告，并提交参评交付物； - 记录并修复用例评审发现的缺陷；
开发人员（DEV）	- 组织设计评审； - 参加测试计划、测试用例等评审；
变更委员会	- 由 DEV/QC/QM/SM/PO 组成 - 负责评估项目变更带来的影响和范围 - 负责调整并验证变更内容

4 变更流程

4.1 流程说明

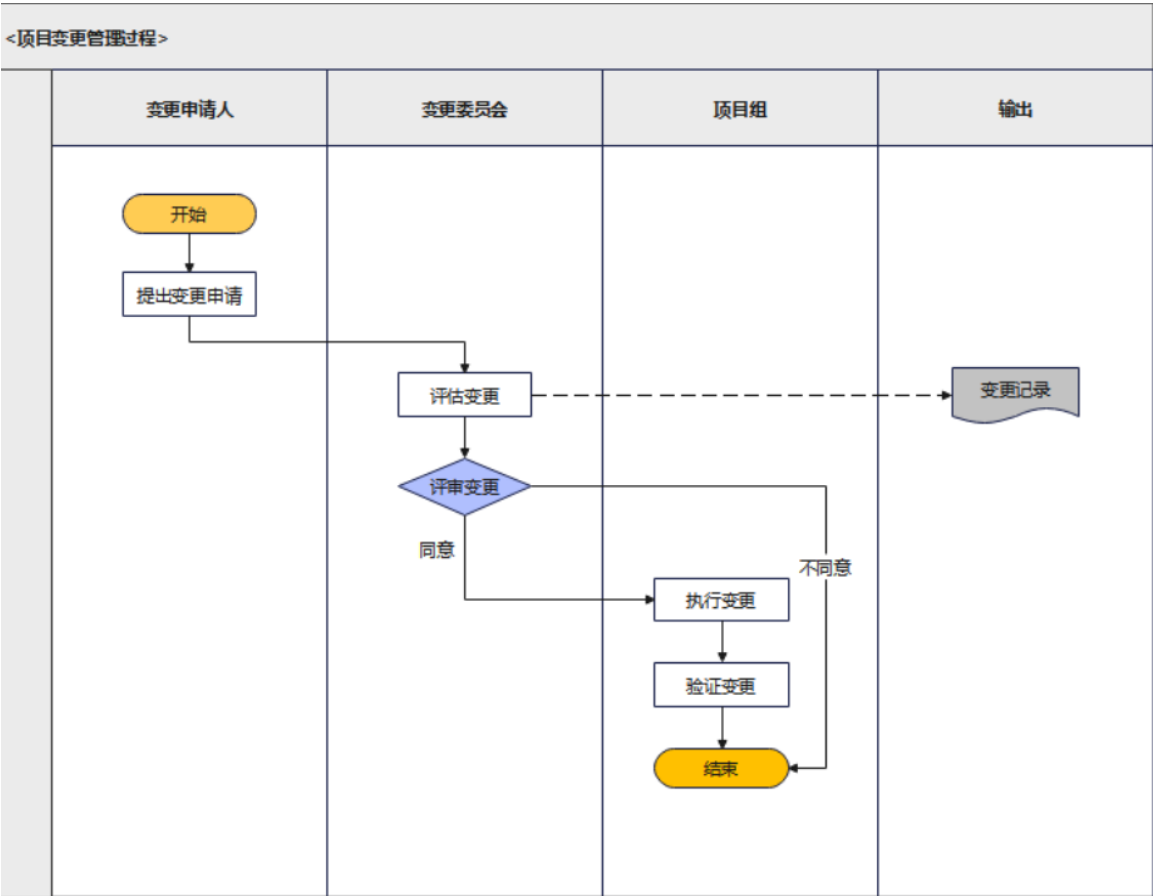

4.1.1 变更申请

项目有变更需求，由变更申请人通过线上/线下方式向变更委员会发起申请，变更申请需明确申请日期、变更类型、变更内容及变更原因等。

4.1.2 评估变更

变更委员会成员收到变更申请后，对变更内容进行评估。其中测试经理负责重点评估变更内容对测试工作的影响，并进行记录。可参考评估内容如下：

重点评估变更影响的范围、变更对测试项目工作量、进度、人员投入的影响；

- 1) 测试经理需要根据变更内容评估测试负责人；
- 2) 重新评估项目变更对测试过程的影响，包括设计用例，执行范围等。

4.1.3 审批变更

变更委员会综合考虑变更的内容、原因及成员评估意见，决定是否接受变更。

如果评审委员会成员一致同意项目变更内容，测试经理应根据变更影响和范围，评估计划，工作量，人员安排等事项并进行调整，如果影响其它项目组，需将调整内容同步并告知相关人员。

如果评审委员会成员未对项目变更内容达成一致或不同意变更，则流程结束，不需要调整后续流程。

4.1.4 执行变更

变更申请经变更委员会评审通过后，测试经理应按照项目变更的内容，组织测试人员开展变更后的执行内容，并将变更相关产出物及时提交Confluence/Jira。

4.1.5 验证变更

测试经理负责组织验证变更执行结果是否符合变更要求，如果不符合，应及时组织人员重新执行变更；如果符合，则通知相关人员执行完毕。

5 出口准则

项目变更内容经过评估，并且对变更内容影响范围的问题不存在分歧。
